



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PEREIRO**



ANEXO I

**04. PROJETO BÁSICO**

(Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas)

**05. ORÇAMENTO BÁSICO**

(Planilha orçamentária)

**06. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(Cronograma de execução da obra e do desembolso financeiro).



**ESTADO DO CEARÁ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO  
 CNPJ: 07.570.518/0001-00  
 RUA DR. ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS, 227, CENTRO  
 TELEFONE: (88) 3527-1394 - CEP: 63.460-000



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO  
**ENDEREÇO:** ZONA URBANA, PEREIRO-CE  
**DATA:** ABRIL/2019

**ENCARGOS SOCIAIS:**  
 DESONERADA  
 BDI: 26,85%

**BANCOS UTILIZADO:**  
 SEINFRA 026.1 CE


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit Com BDI	Total (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					<b>4.399,38</b>
1.1	COMP.01	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	596,50	756,66	2.269,98
1.2	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6,00	279,78	354,90	2.129,40
2			PAVIMENTAÇÃO					<b>60.287,89</b>
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	m²	649,25	0,06	0,08	51,94
2.2	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	m²	584,33	62,87	79,75	46.600,32
2.3	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	m	185,50	43,65	55,37	10.271,14
2.4	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	m²	649,25	0,23	0,29	188,28
2.5	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	m³	6,49	38,71	49,10	318,66
2.6	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	6,49	347,10	440,30	2.857,55
3			LIMPEZA FINAL					<b>818,06</b>
3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	649,25	0,99	1,26	818,06
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI</b>							<b>R\$ 65.505,33</b>	

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 65.505,33 (SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).**

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
 José Kildare Felinto Coares  
 CIVIL / CREA 060158/07-3





**ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00  
RUA DR. ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, 227 - Centro  
TELEFONE: (88) 3527-1250/3527-1260 - CEP: 63.460-000



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO

**ENCARGOS SOCIAIS:**

**BANCOS UTILIZADO:**

**ENDEREÇO:** ZONA URBANA, PEREIRO-CE

**BDI:** 26,85%

DESONERADA

SEINFRA 026.1 CE

**DATA:** ABRIL/2019

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.399,38	1.466,46	1.466,46	1.466,46
2	PAVIMENTAÇÃO	60.287,89	20.095,96	20.095,96	20.095,97
3	LIMPEZA FINAL	818,06			818,06
	Custo Mensal		21.562,42	21.562,42	22.380,49
	Custo Acumulado		21.562,42	43.124,84	65.505,33


Total Geral | R\$ 65.505,33

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

4FC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
José Kildare Felinto Colares  
CIVIL / CREA 06015/A-07-3







**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO**  
 CNPJ: 07.570.518/0001-00  
 RUA DR. ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, 227 - Centro  
 TELEFONE: (88) 3527-1250/3527-1260 - CEP: 63.460-000



**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO**

**ENDEREÇO: ZONA URBANA, PEREIRO-CE**

**COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERC. %
------	---------------	---------

<b>A ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
AC	Administração Central	3,50%
<b>Total (A)</b>		<b>3,50%</b>

<b>B DESPESAS INDIRETAS</b>		
S+G	TAXA DE SEGURO + GARANTIA	0,80%
R	TAXA DE RISCO	0,97%
DF	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
<b>Total (B)</b>		<b>2,62%</b>

<b>C LUCRO</b>		
L	Lucro Operacional	6,16%
<b>Total (C)</b>		<b>6,16%</b>

<b>D TAXAS E IMPOSTOS</b>		
T	PIS	0,65%
T	COFINS	3,00%
T	ISSQN	3,00%
T	CPRB	4,50%
<b>Total (D)</b>		<b>11,15%</b>

<b>MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BDI</b>		
<b>BDI =</b>	$\frac{(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)}$	<b>-1</b>

<b>BONIFICAÇÃO SOBRE DESPESAS INDIRETAS (B.D.I) =</b>	<b>26,85%</b>
---	---------------

**ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL**

KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
 José Kildare Felinto Coares  
 CIVIL / CREA 060158407-3



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO  
 CNPJ: 07.570.518/0001-00  
 RUA DR. ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, 227 - Centro  
 TELEFONE: (88) 3527-1250/3527-1260 - CEP: 63.460-000



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO

ENDEREÇO: ZONA URBANA, PEREIRO-CE

**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %	MENSALISTAS %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

José Kildare Felinto Coares

Civil / CREA 0601584/07.3

6

J

PEREIRO PREF GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00  
RUA DR. ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS, 227, CENTRO  
TELEFONE: (88) 3527-1394 - CEP: 63.460-000



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO  
**ENDEREÇO:** ZONA URBANA, PEREIRO-CE  
**DATA:** ABRIL/2019

**ENCARGOS SOCIAIS:**  
DESONERADA  
BDI: 26,85%

**BANCOS UTILIZADO:**  
SEINFRA 026 CE

**Planilha Orçamentária Analítica**

1	SERVIÇOS PRELIMINARES			Und	Quant.	Valor Unit	3.468,19
1.1	Código	Banco	Descrição	MÊS			Total
Composição	COMPOSIÇÃO 9	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	1,0000000	596,50	596,50
Insumo	12322	SEINFRA	ENGENHEIRO	H	0,3740432	70,64	26,42
Insumo	18598	SEINFRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2228093	2.558,59	570,08

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
José Kildare Felinto Coraeres  
CIVIL / CREA 060158407-3



R DR ANT A DE VASCONCELOS TERREO - SEDE CENTRO - PEREIRO / CE  
(84) 9832-7058 / marcoskalixta@gmail.com

Relatório gerado em orcafascio.com



PEREIRO PREF GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00



**ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00  
RUA DR. ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS, 227, CENTRO  
TELEFONE: (88) 3527-1394 - CEP: 63.460-000



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO

**ENDEREÇO:** ZONA URBANA, PEREIRO-CE

**DATA:** ABRIL/2019

**BDI:** 26,85%

**ENCARGOS SOCIAIS:**  
DESONERADA


**BANCOS UTILIZADO:**  
SEINFRA 026.1 CE

**Planilha Orçamentária Analítica**

1.2	Código	Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	1,0000000	279,78	279,78
Composição Auxiliar	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0,0125000	451,61	5,65
Insumo	I0871	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	0,1700000	17,10	2,91
Insumo	I8395	SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	1,0000000	79,39	79,39
Insumo	I1530	SEINFRA	MONTADOR	3,0000000	17,83	53,49
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	3,0000000	17,83	53,49
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	3,0000000	13,21	39,63
Insumo	I1945	SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	0,1700000	23,14	3,93
Insumo	I2170	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	1,5000000	27,53	41,30
<b>2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>60.287,89</b>
<b>2.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	I0642	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHI)	0,0000000	80,86	0,00
Insumo	I0756	SEINFRA	MOTO NIVELADORA (CHP)	0,0002518	206,82	0,05
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	0,0006000	13,21	0,01
<b>2.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	1,0000000	62,87	62,87

R DR ANT A DE VASCONCELOS TERREO - SEDE CENTRO - PEREIRO / CE  
(84) 9832-7058 / marcoskalixta@gmail.com

Relatório gerado em orcafascio.com



PEREIRO PREF GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00

Composição Auxiliar	C0171	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	0,0200000	362,02	7,24
Insumo	I0111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	0,1500000	46,00	6,90
Insumo	I0445	SEINFRA	CALCETEIRO	0,1500000	17,83	2,67
Insumo	I0726	SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	0,0100000	77,32	0,77
Insumo	I2527	SEINFRA	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	32,0000000	1,25	40,00
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	0,4000000	13,21	5,28
<b>2.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C0366	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	1,0000000	43,65	43,65
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	0,0200000	35,01	0,70
Composição Auxiliar	C3324	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	0,0007000	308,52	0,22
Composição Auxiliar	C3251	SEINFRA	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	1,0000000	30,92	30,92
Composição Auxiliar	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	0,2500000	3,90	0,98
Composição Auxiliar	C3127	SEINFRA	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	0,0030000	68,83	0,21
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	0,3000000	17,83	5,35
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEANTE	0,4000000	13,21	5,28
<b>2.4</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	0,0040000	14,52	0,06
Insumo	I0700	SEINFRA	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	0,0010000	69,73	0,07
Insumo	I0758	SEINFRA	NÍVEL (CHP)	0,0020000	0,55	0,00
Insumo	I2382	SEINFRA	NIVELADOR	0,0020000	21,46	0,04
Insumo	I0775	SEINFRA	TEODOLITO (CHP)	0,0020000	1,41	0,00
Insumo	I2445	SEINFRA	TOPOGRAFO	0,0020000	28,70	0,06
<b>2.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>

R DR ANT A DE VASCONCELOS TERREO - SEDE CENTRO - PEREIRO / CE  
(84) 9832-7058 / marcoskalixta@gmail.com


Relatório gerado em orcafascio.com






PEREIRO PREF GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00


Composição	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	1,0000000	38,71	38,71
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	2,9300000	13,21	38,71
<b>2.6</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	1,0000000	347,10	347,10
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	0,7780000	51,00	39,68
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	0,9658000	76,75	74,13
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	220,0000000	0,46	101,20
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	10,0000000	13,21	132,10
<b>3</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>			<b>818,06</b>
<b>3.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	0,0750000	13,21	0,99



ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
José Kildare Felinto Coraes  
Civil / CREA 0601584/7-3





**ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00  
RUA DR. ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS, 227, CENTRO  
TELEFONE: (88) 3527-1394 - CEP: 63.460-000



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO

ENDEREÇO: ZONA URBANA, PEREIRO-CE

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**1.0**

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

**COMP.01**

REPRESENTA 3,59% DA OBRA SEM O BDI

**1.1**

**3,00**

**MÊS**

PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

**C4541**

**LOCAL**

**LARG.**

**COMP.**

**AREA**

**AREA**

**1.2**

3,00

2,00

6,00

**6,00**

**M2**

**2.0**

**PAVIMENTAÇÃO**

RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA

**C2873**

**LOCAL**

**LARG.**

**COMP.**

**AREA**

**AREA**

**2.1**

7,00

92,75

649,25

**649,25**

**M2**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

**C2893**

**LOCAL**

**LARG.**

**COMP.**

**AREA**

**AREA**

**2.2**

6,30

92,75

584,33

**584,33**

**M2**

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

**C3232**

**LOCAL**

**LADOS**

**COMP.**

**AREA**

**2.3**

2,00

92,75

185,50

**185,50**

**M2**

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

**C0366**

**LOCAL**

**LARG.**

**COMP.**

**METRO**

**2.4**

Comprimento

7,00

92,75

649,25

**649,25**

**M**

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

**C1256**

**LOCAL**

**LADOS**

**COMP.**

**LARG.**

**PROFUN.**

**VOLUME**

**2.5**

2,00

92,75

0,35

0,10

6,49


**6,49**

**M3**

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO  
CNPJ: 07.570.518/0001-00  
RUA DR. ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS, 227, CENTRO  
TELEFONE: (88) 3527-1394 - CEP: 63.460-000



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO

ENDEREÇO: ZONA URBANA, PEREIRO-CE

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

C0836	LOCAL	VOLUME	
2.6	ITEM 2.5	6,49	
		6,49	M3

3.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA			
C3447	LOCAL	AREA	
3.1	ITEM 2.1	649,25	
		649,25	M2

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
José Kildare Felinto Corares  
CIVIL / CREA 060158407-3

*b*

*d*







SIRGAS 2000  
FUSO 24M  
MERIDIANO 39°W



SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO

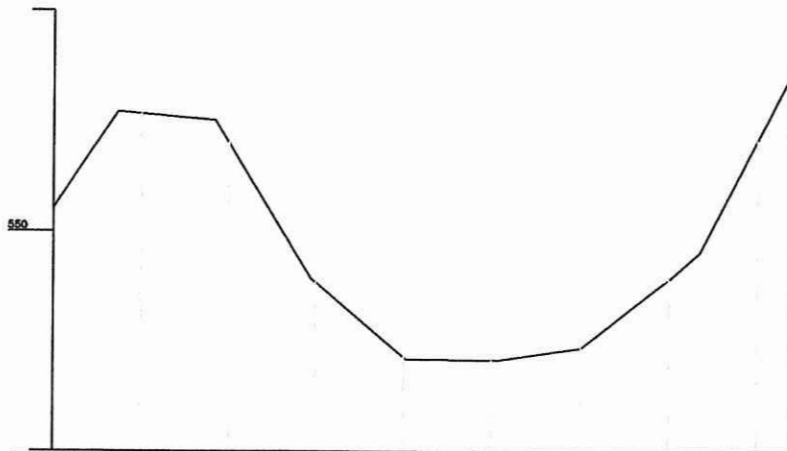

Estação Anterior	Estação	Comprimento	Área (m²)	Extensão (m)	Prancha
0+0,000	0+0,000	350,818			
0+14,875	0+14,875	352,897		L = 14,875	
0+18,934	0+18,934	352,850		L = 22,259	
0+20,904	0+20,904	352,804		L = 22,070	
0+23,054	0+23,054	349,833		L = 21,645	
0+24,840	0+24,840	347,184		L = 20,649	
0+26,236	0+26,236	344,087		L = 45,839	
0+27,137	0+27,137	342,851			
0+27,137	0+27,137	342,858		L = 20,582	
0+27,719	0+27,719	338,078			
0+28,740	0+28,740	333,591			

*Ass: [Signature]*

KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
José Kildare Felinto Coares  
CIVIL / CREA 060154/07-3


QUADRO DE ÁREAS			
LOGRADOURO	AREA (m²)	EXTENSÃO	PRANCHA
TRECHO 01	649,25	92,75	UNICA

PLANTA DO IMÓVEL

Nome: FASE 01 - PAVIMENTO  
 Localização: PAVIMENTO TRANSVERSAL DE TREVIM  
 Escala: 1:50  
 Data: 11/08/19

Auto: FELTO  
 Ass: FELTO  
 Atividade:

Escala: 1:50  
 Projeto: PAVIMENTO TRANSVERSAL DE TREVIM



*8* *9*

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA  
José Kildare Felinto Coares  
CIVIL / CREA 060158407-3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO

Nº CE20190472511

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



COMPLEMENTAR à  
CE20190470146

1. Responsável Técnico

JOSE KILDARE FELINTO COLARES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPEC.EM ENGENHARIA ESTRUTURAL

RNP: 0601564073

Registro: 11841D CE

Empresa contratada: KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Registro: 0000410098-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

CPF/CNPJ: 07.570.518/0001-00

RUA ANTONIO AUGUSTO VASCONCELOS

Nº: 227

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Pereiro

UF: CE

CEP: 63460000

Contrato: 03.04.01/2019

Celebrado em: 03/04/2019

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos

Nº: 227

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Pereiro

UF: CE

CEP: 63460000

Telefone: (88) 3527-1250

Email:

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Data de Início: 03/04/2019

Previsão de término: 31/12/2019

Código: Não especificado

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

CPF/CNPJ: 07.570.518/0001-00

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍEDOS

649,25

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO P/ PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARTEIRA CHIQUINHA DE ALPINO, BAIRRO BELA VISTA, SEDE. PEREIRO-CEARÁ.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEREIRO, 17 de ABRIL de 2019

Local

data

*Jose Kildare Felinto Colares*

JOSE KILDARE FELINTO COLARES - CPF: 738.162.484-20

*Roberto Almeida de Souza*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CNPJ: 07.570.518/0001-00

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 17/04/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8213284333

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x7DZ  
Impresso em: 22/04/2019 às 18:05:00 por: ip: 179.186.153.131

[www.crea-ce.org.br](http://www.crea-ce.org.br)

[faleconosco@crea-ce.org.br](mailto:faleconosco@crea-ce.org.br)

Tel: (85) 3453-5804

Fax: (85) 3453-5804

